

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
COORDENAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA**

**CONSULTA PÚBLICA [●]
PROCESSO SEI N° [●]/2023
CONCORRÊNCIA N° [●]/2023**

ANEXO III DO CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA

APÊNDICE I – CRONOGRAMA DO PROJETO E MARCOS TEMPORAIS

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) NA MODALIDADE
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA ATIVAÇÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DO
GASÔMETRO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

1. Prazos para entrega de produtos e atestes

Conforme descritos no ANEXO III do CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, os produtos e atestes da CONCESSÃO estão compilados na Tabela 1, abaixo:

Tabela 1 – Prazos gerais da CONCESSÃO

Fase	Prazo máximo (sem reapresentações)	Marco referencial	Produto	Agente
FASE DE PROJETO	30 dias	DATA DA ORDEM DE INÍCIO	PLANO DE IMPLANTAÇÃO	CONCESSIONÁRIA
	15 dias	Recebimento do PLANO DE IMPLANTAÇÃO	Emissão do termo de aprovação do PLANO DE IMPLANTAÇÃO	PODER CONCEDENTE
	60 dias	Emissão do termo de aprovação do PLANO DE IMPLANTAÇÃO	PROJETO BÁSICO	CONCESSIONÁRIA
	30 dias	Recebimento do PROJETO BÁSICO	Emissão do termo de aprovação do PROJETO BÁSICO	PODER CONCEDENTE
	-	Antes do início das obras	PROJETO EXECUTIVO e DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO	CONCESSIONÁRIA
	Imediato	Recebimento do PROJETO EXECUTIVO e DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO	TERMO DE FINALIZAÇÃO DA FASE DE PROJETO	PODER CONCEDENTE
FASE DE IMPLANTAÇÃO	24 meses	DATA DA ORDEM DE INÍCIO	Comunicação da finalização das obras	CONCESSIONÁRIA
	15 dias	Comunicação da finalização das obras	Agendamento e realização da VISTORIA GERAL	PODER CONCEDENTE
	10 dias	Agendamento e realização da VISTORIA GERAL	TERMO DE ACEITE DA OBRA	PODER CONCEDENTE
	30 dias	Emissão do TERMO DE ACEITE DA OBRA	PROJETO AS BUILT	CONCESSIONÁRIA


Fase	Prazo máximo (sem reapresentações)	Marco referencial	Produto	Agente
	5 dias	Recebimento do PROJETO AS BUILT	TERMO DE FINALIZAÇÃO DA FASE DE IMPLANTAÇÃO	PODER CONCEDENTE
FASE DE OPERAÇÃO	30 dias	Emissão do TERMO DE ACEITE DA OBRA	Comunicação do início das operações	CONCESSIONÁRIA
	5 dias	Comunicação do início das operações	Emissão do TERMO DE INÍCIO DA OPERAÇÃO	PODER CONCEDENTE
	18 meses	DATA DA ORDEM DE INÍCIO	PLANO OPERACIONAL	CONCESSIONÁRIA
	15 dias	Recebimento do PLANO OPERACIONAL	Termo de aprovação do PLANO OPERACIONAL	PODER CONCEDENTE
	18 meses	DATA DA ORDEM DE INÍCIO	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	CONCESSIONÁRIA
	30 dias	Recebimento da PROGRAMAÇÃO CULTURAL	Termo de aprovação da PROGRAMAÇÃO CULTURAL	PODER CONCEDENTE
	12 meses	DATA DA ORDEM DE INÍCIO	PROGRAMA DE INTEGRIDADE	CONCESSIONÁRIA
	30 dias	Fim de cada trimestre, contados a partir da DATA DA ORDEM DE INÍCIO	RELATÓRIO TRIMESTRAL GERENCIAL	CONCESSIONÁRIA
	45 dias	Fim de cada ano, contados a partir da DATA DA ORDEM DE INÍCIO	RELATÓRIO ANUAL GERENCIAL	CONCESSIONÁRIA

Fonte: São Paulo Parcerias, 2023.

2. Fluxogramas de produtos e atestes


Os prazos dos produtos e atestes da CONCESSÃO, conforme item 1, estão compilados nos fluxogramas das figuras Figura 1, Figura 2 e Figura 3, abaixo:

Figura 1 - Fluxograma de produtos e atestes da FASE DE PROJETO

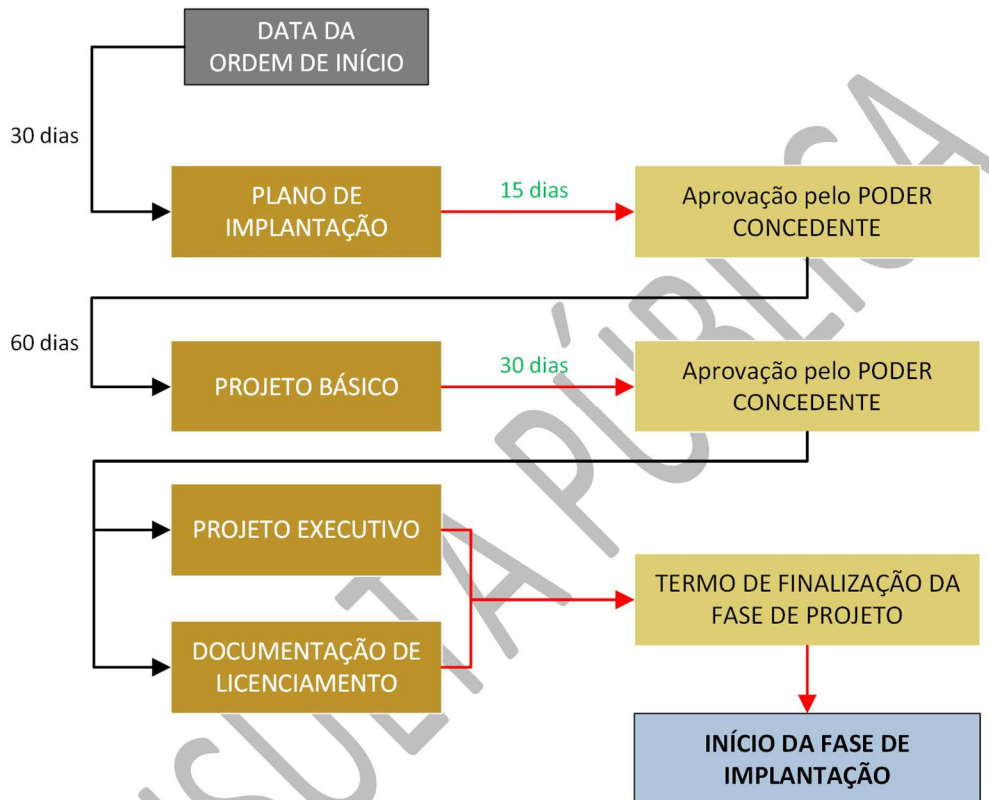


Fonte: São Paulo Parcerias, 2023.

Figura 2 – Fluxograma de produtos e atestes da FASE DE IMPLANTAÇÃO

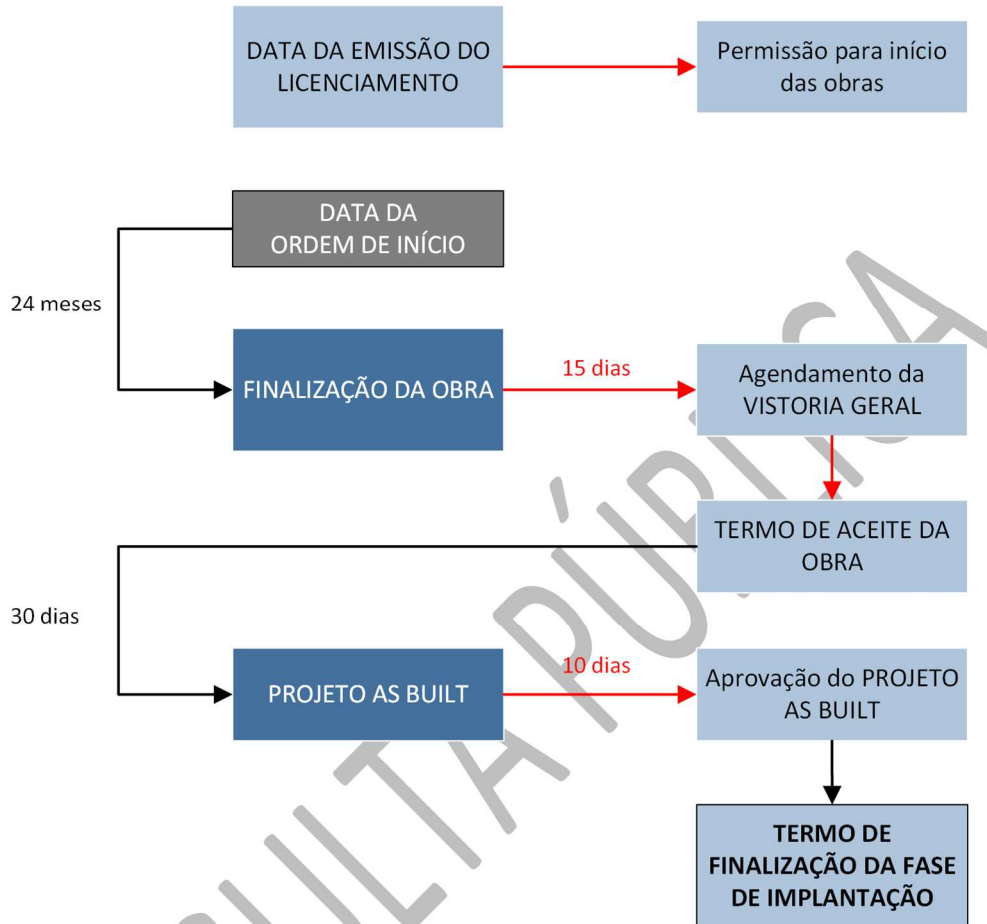

Fonte: São Paulo Parcerias, 2023.

Figura 3 – Fluxograma de produtos e atestes da FASE DE OPERAÇÃO

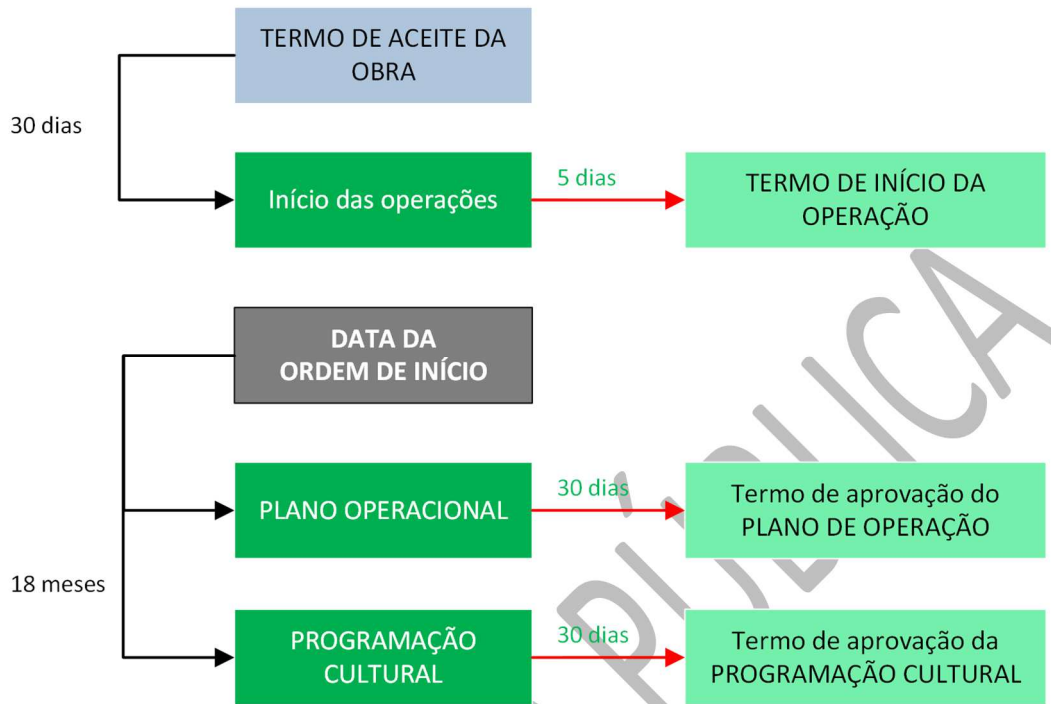

Fonte: São Paulo Parcerias, 2023.
